



ТОО Қарағанды Су

**Информация о ходе исполнения  
утвержденной инвестиционной  
программы на услуги водоснабжения  
и водоотведения**

**За 2025 год**



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоснабжению за 2025 года, млн.тенге

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед.изм.	Утверждено		Факт		Отклонение		пояснения
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1.	<b>Раздел 1. Служба водоснабжения и очистки</b>			<b>1 158</b>		<b>827</b>		<b>-332</b>	
1.1	Замена запорной арматуры 10 ед.	раб.	1	66		60		-6	Экономия в результате конкурсных процедур
1.2	Реконструкция Насосной станции № 2	раб.	1	503	1	408		-95	
1.3	Капитальный ремонт РЧВ № 3	раб.	1	590	1	359		-231	
2.	<b>Раздел 2. Реконструкция и капитальный ремонт сетей</b>		<b>24 558</b>	<b>1 396</b>	<b>24 631</b>	<b>1 062</b>	<b>73</b>	<b>-335</b>	Реконструкция участков водопроводных сетей в разных районах города Караганды. Экономия в результате конкурсных процедур, на проведение технического надзора, применение более эффективных методов и технологий.
2.1	Капитальный ремонт водопроводных сетей 8 объектов	метр	19 615	1 396	19 615	1 062	0	-335	
2.2	Мероприятия по нац. проекту "Тариф в обмен на инвестиции" 5 объектов	метр	5 847	428	5 847	345	0	-83	
3.	<b>Раздел 3. Служба главного энергетика</b>			<b>72</b>		<b>38</b>		<b>-34</b>	
3.1.	Приобретение дизельных электростанций	шт.	3	72	3	38			Экономия в результате конкурсных процедур
4.	<b>Раздел 4. Погашение основного долга</b>	млн.тг.		<b>55</b>		<b>55</b>		<b>0</b>	
	<b>Направления использования экономии средств</b>					<b>700</b>			
5.	Увеличение зарплаты персонала сверх уровня, учтенного в тарифной смете	млн.тг.				<b>275</b>			
6.	Приобретение новых основных средств, не учтенных в ИП:	ед.			<b>99</b>	<b>166</b>			
6.1	- автокран	ед.			1	92			
6.2	- оборудование	ед.			98	74			2 насоса, 2 УЗ расходомера, 2 компрессора, аппарат для сварки пластмассовых труб, 24 компьютера, 17 МФУ, АТС, комплектующие для ремонта системы визуализации ЦДС и системы видеонаблюдения, 3 стиральные машины на участки для стирки спец.одежды
7.	Капитальный ремонт оборудования и сооружений	ед.			<b>5</b>	<b>31</b>			Кап. ремонт 3 электродвигателей на СВИо, капитальный ремонт узла НС 2 зона
8.	Предпроектные, проектные работы по мероприятиям ИП 2026 г (инженерно-геологические работы, техническое обследование, ПСД, экспертиза)					<b>39</b>			
9.	Выплаты по договору финансового лизинга ОДУ	млн.тг.				<b>189</b>			
	<b>ВСЕГО за 2025 год</b>			<b>2 682</b>		<b>2 682</b>		<b>0</b>	



## Замена запорной арматуры на БОС 1 очереди:

- задвижки чуг. д-1000 мм с эл/прив - 2 шт.;
- гидрозатворы д-600 мм с эл/прив - 2 шт.;

### Затвор



### Задвижка Д 1000 мм



#### Эффект:

1. Повышение надежности работы оборудования,
2. Снижение потерь,
3. Снижение риска возникновения аварий,
4. Сокращение времени производства ремонтных работ



# Реконструкция Насосной станции № 2

## 2 этап. Завершение

*До: критический уровень износа 80-100%*



*После: реконструкция здания, установка частотного преобразователя*



**Эффект:** Предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации, снижение износа, автоматизация, экономия электрической энергии в размере 10%, повышение ресурса оборудования и трубопроводов.



## Капитальный ремонт РЧВ № 3 Комплекса водоочистных сооружений

*До*




*После*



**Эффект:** Снижение потерь, повышение качества услуг водоснабжения



## Приобретение 2 дизельных электростанций и 1 трансформатора напряжения

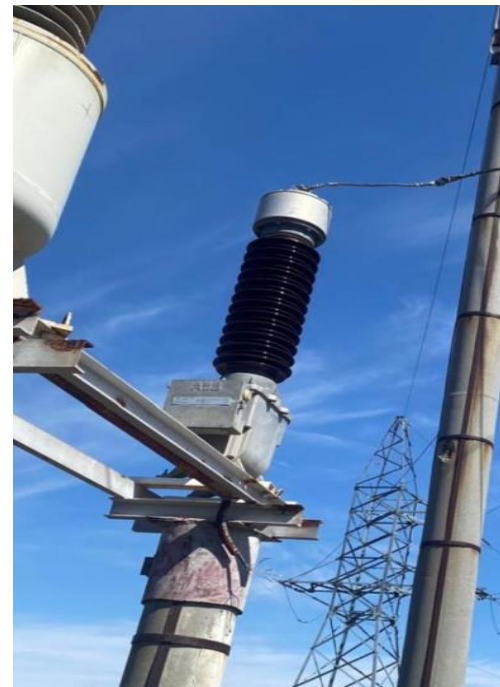

**Эффект:** Бесперебойное электроснабжение объектов предприятия с целью бесперебойного оказания услуг потребителям



## Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2025 года



Реконструкция водопровода Ул.40 лет ВЛКСМ



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Реконструкция водопровода от скв. 115 до н/ст 5 узел (Водопровод по ул. Балхашская)



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Реконструкция водопровода внутри м-на 4 Н. Город, Ержанова, по ул.Интернационалистов, по ул.Связи  
(ул.В.Интернационалистов (от ул. Алиханова до ул. Ермакова))



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Капитальный ремонт водопровода по ул. Ильича



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Реконструкция водопровода по ул. Крылова



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Капитальный ремонт водопровода по ул. Пахотная, Карабасская до КОС



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Капитальный ремонт водопровода по ул. Хабаровской



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 2025 года, млн.тенге

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед.изм.	Утверждено		Факт		Отклонение		пояснения
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1.	<b>Раздел 1. Реконструкция и капитальный ремонт сетей</b>		17 788	2 354	17 894	1 829	106	-525	Реконструкция участков канализационных сетей в разных районах города Караганды. Экономия в результате конкурсных процедур; на проведение технического надзора; применение более эффективных методов и технологий.
1.1	Капитальный ремонт канализационных сетей 31 объект	метр	17 788	517	17 894	461	106	-56	
1.2	Мероприятия по нац. проекту "Тариф в обмен на инвестиции"	метр	15 233	1 837	15 338	1 368	106	-469	
2.	<b>Раздел 2. Погашение основного долга</b>	млн. тг.		321		321		0	
3.	<b>Раздел 3. Энерго-механическая служба</b>			902		861	0	-41	
3.1	Замена насосных агрегатов на КНС	раб.	1	454	1	399	0	-55	Экономия в результате конкурсных процедур
3.2	Строительство воздушно-кабельной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС "Костенко" до РУ-6 кВ КНС-13 г.Караганда	раб.	1	226	1	226	0	0	
3.3	Реконструкция канализационной насосной станции № 13 в г. Караганда	раб.	1	222	1	236	0	14	
<b>Направления использования экономии средств</b>						<b>566</b>			
4.	<b>Приобретение новых основных средств:</b>	ед.			121	100			
4.1	- буровая установка для бестраншейной прокладки труб	ед.			1	35			
4.2	- оборудование и прочие основные средства	ед.			120	65			1 компрессорная станция, 2 погружных кан. насоса, 10 вытяжных вентиляторов, 4 сплит-системы на КНС, 24 компьютера, 17 МФУ, АТС, комплектующие для ремонта системы визуализации ЦДС и системы видеонаблюдения, 1 стиральная машина на Ю-В цех ВО для стирки спец.одежды
5.	<b>Капитальный ремонт оборудования и сооружений</b>	ед.			3	110			Кап. ремонт 2 электродвигателей на КНС, кровли КНС-10
6.	Предпроектные, проектные работы по мероприятиям ИП 2026 года (инженерно-геологические работы, техническое обследование, ПСД, экспертиза)	млн. тг.				29			
7.	На увеличение заработной платы персонала сверх учтенного в тарифной смете уровня	млн. тг.				327			
<b>ВСЕГО за 2025 год</b>				<b>3 577</b>		<b>3 577</b>			



## Замена 2 насосных агрегатов на КНС



**Эффект:** Предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации вследствие паводков, снижение износа, автоматизация, экономия электрической энергии



## Строительство воздушно-кабельной линии 6 кВ от ЗРУ-6кВ ПС «Костенко» до РУ-6 кВ КНС-13



**Эффект:** Обеспечение резервного энергоснабжения, бесперебойной надежной работы, предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации.

# Реконструкция КНС № 13. 1 этап

*До: критический уровень износа*



*Срок реконструкции: 2025 – 2027 годы*



**Ожидаемый эффект:** Снижение износа, предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации, автоматизация, экономия электрической энергии



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Капитальный ремонт канализационных сетей мкр. 23 д. 16-19




## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Капитальный ремонт канализационных сетей мкр.23 Пришахтинск д.27-46




## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года

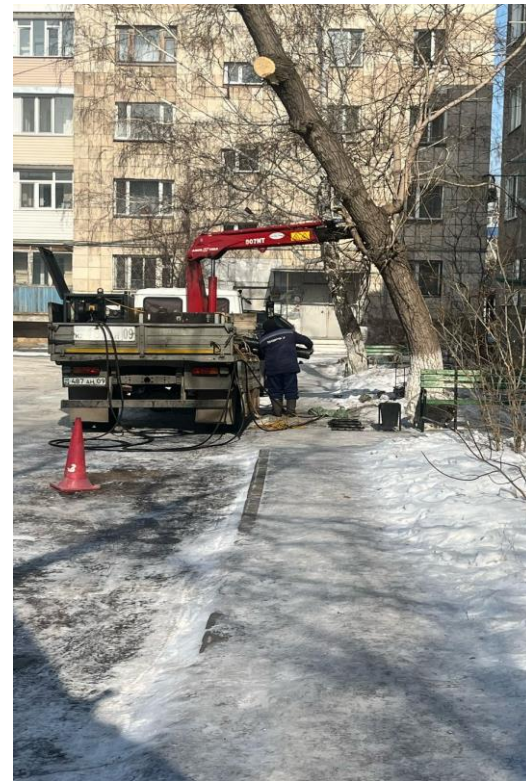

Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Metallistov д.26/4



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года

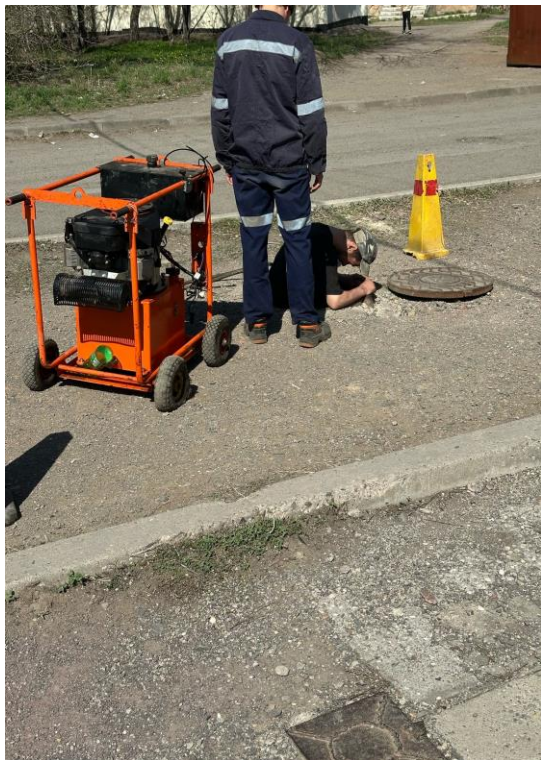

Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Сталелитейная



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Капитальный ремонт главного коллектора по ул. Магнитогорская



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Капитальный ремонт канализационной линии по пр. Н.Абдирова 25



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Реконструкция Коллектора от 50кв Н.Города до главного коллектора (пр.Б.Жырау 33,35, ул.В. Интернационалистов 22а)




# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Гапеева




# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года

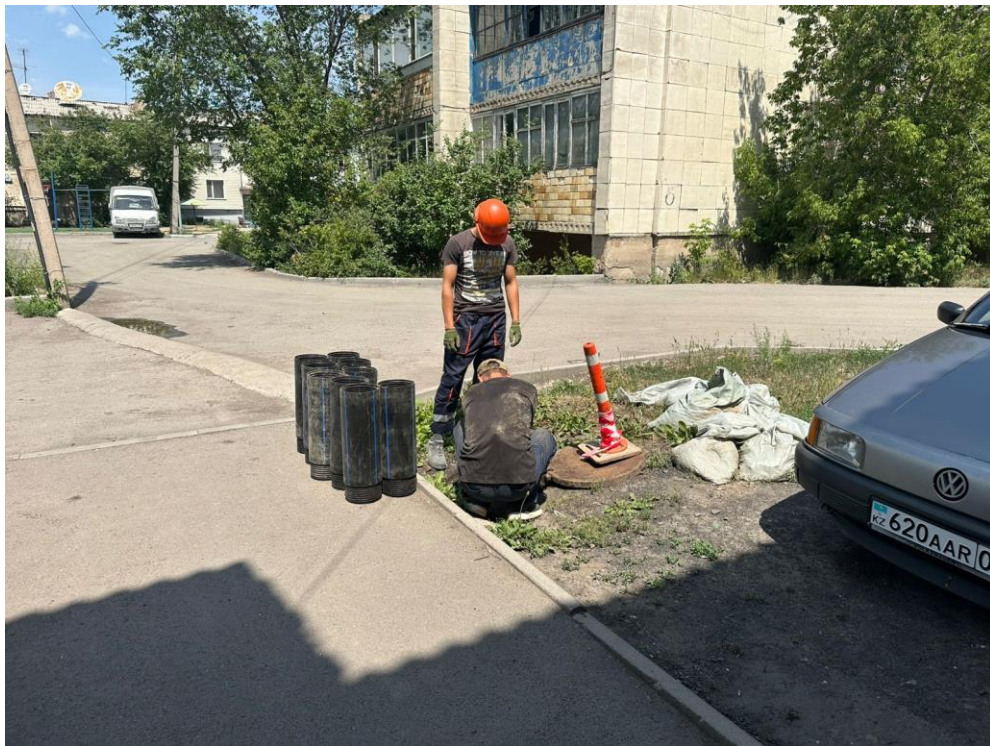

Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Мирная



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года

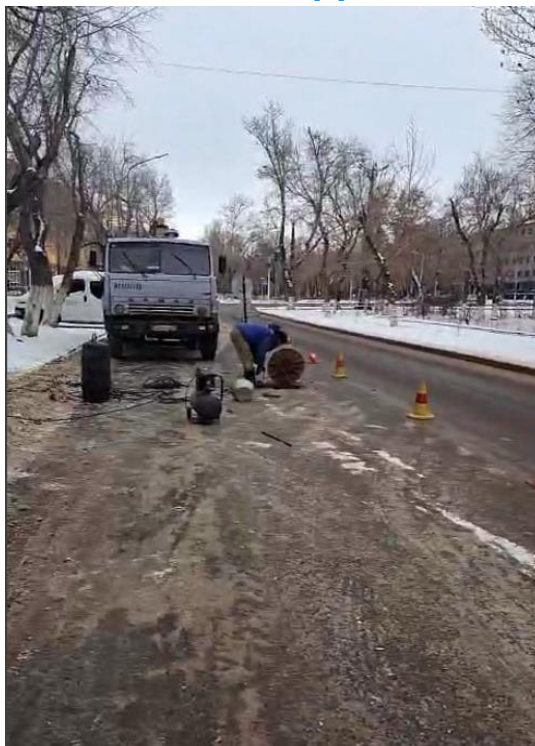

Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Н. Назарбаева от д.46 до д.38



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Штурманская



## Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2025 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Орбита



**Благодарим за внимание!**

*[www.kar-su.kz](http://www.kar-su.kz)*

