



ТОО «Қарағанды Су»

**Отчет о деятельности
по предоставлению услуг,
об исполнении утвержденных
тарифных смет и инвестиционных
программ по регулируемым услугам
водоснабжения и водоотведения**

за первое полугодие 2025 года

23 июля 2025 года



Основано в 1958 году

Основано в 1958 году

**Форма
собственности:**

100% - ГУ «Отдел
государственных
активов и закупок
города Караганды»

Характеристика предприятия


Наименование	Ед. изм.	Водоснабжение	Водоотведение
Производительность комплексов водоподготовки и приемки стоков (проектная / фактическая)	тыс.м ³ /сутки	650 / 208	232 / 112
Протяженность сетей, в т.ч.:	км	1 119	737
в доверительном управлении и оперативном обслуживании	км	174	79
Количество насосных станций, в т.ч.:	ед.	99	13
главные	ед.	9	
подкачивающие	ед.	90	
в том числе в доверительном управлении и оперативном обслуживании	ед.	1	4
Воздушные и кабельные линии электропередач	км	77	
Подстанции	ед.	15	
Численность персонала, в т.ч.	чел.	1620	



Виды деятельности



Основные регулируемые виды деятельности



**Услуги
водоснабжения**



**Услуги
водоотведения**

Иные виды деятельности не осуществляются



Тарифы на услуги водоснабжения

тенге за 1 м³

Гос. программа «Тариф в обмен на инвестиции»

№	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	Приказ № 67-ОД		Приказ № 67-ОД		% роста к 2024 г.	Приказ № 81		% роста к 2024 г.
		с 01.01.2024 г.		с 01.01.2025 г.			с 01.02.2025 г.		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС		без НДС	с НДС	
1	Подача воды по магистральным трубопроводам								
1.1.	Дачи (техническая вода)	39,66	44,42	37,89	42,44	-4,5%	47,77	53,50	20%
1.2.	ТОО "Окжетпес-Т"	126,30	141,46	161,52	180,90	27,9%	151,56	169,75	20%
1.3.	ТОО «Караганда Энергоцентр»	162,07	181,52	161,52	180,90	-0,3%	240,52	269,38	48%
1.4.	ТОО «Теплотранзит Караганда»	198,26	222,05	197,59	221,30	-0,3%	237,91	266,46	20%
2	Подача воды по распределительным сетям								
2.1.	Физические лица (население)	133,98	150,06	127,96	143,32	-4,5%	160,78	180,07	20%
2.2.	Бюджетные организации	1 114,36	1 248,08	1 110,61	1 243,88	-0,3%	780,05	873,66	-30%
2.3.	Предприятия малого бизнеса до 5000 м³ в год	491,31	550,27	489,65	548,41	-0,3%	591,83	662,85	20%
2.4.	Предприятия среднего и крупного бизнеса свыше 5000 м³ в год	1 085,96	1 216,28	1 082,30	1 212,18	-0,3%	1 308,15	1 465,13	20%
Средний тариф		212,15		210,13		-1,0%	255,55		20%



Тарифы на услуги водоотведения

тенге за 1 м³

Гос. программа «Тариф в обмен на инвестиции»

№	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	Приказ № 67-ОД		Приказ № 67-ОД		% роста к 2024 г.	Приказ № 10-ОД		% роста к 2024 г.
		с 01.01.2024 г.		с 01.01.2025 г.			с 01.02.2025 г.		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС		без НДС	с НДС	
1	Население	190,18	213,00	119,52	133,86	-37%	209,64	234,80	10%
2	Бюджетные организации	898,86	1 006,72	599,08	670,97	-33%	898,86	1 006,72	0%
3	Прочие потребители	841,27	942,22	560,69	627,97	-33%	882,79	988,72	5%
Средний тариф		379,44		247,74		-35%	381,17		0,5%



Основные финансово-экономические показатели

млн. тенге

ПОКАЗАТЕЛИ	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2024 г. (5 мес.)	1-ое полугодие 2025 г. (5 мес.)	Откл. 1 п/г 2025 / 1 п/г 2024, %
Основная деятельность							
Доходы	3 842	4 476	5 337	6 380	8 066	8 628	7%
Затраты на производство	3 439	3 797	4 583	5 541	5 742	6 701	17%
Расходы периода	320	362	384	442	452	749	66%
Финансовые расходы	1,0	1,0	6,0	18	11	7	-38%
Результат от основной деятельности	82	316	364	379	1 861	1 171	-37%
Инвестиции	132	50	163	2 867	492	373	-24%
в т.ч. за счет собственных средств	132	50	163	995	492	373	
за счет заемных средств	0	0	0	1 872	-	-	

**С 2023 года государственная программа
«Тариф в обмен на инвестиции»**



Анализ объемов предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2025 г. (млн. м³)

ПОКАЗАТЕЛИ	Утверждено в тарифной смете на год	Факт 6 мес. 2025 г.	% исполнения
Услуги водоснабжения			
ТОО «Караганда Энергоцентр»	17,9	10,4	58%
ТОО «Теплотранзит Караганда»	3,1	1,7	53%
ТОО «Окжетпес-Т»	4,5	2,0	44%
Дачи	0,2	0,08	39%
Бюджет	1,1	0,5	44%
Промышленность	3,4	1,6	47%
Население	17,1	8,6	50%
Итого услуги водоснабжения	47,4	24,8	52%
Услуги водоотведения			
Бюджет	1,5	0,6	39%
Население	17,2	8,9	52%
Прочие потребители	4,5	2,2	50%
Итого услуги водоотведения	23,2	11,7	51%



Исполнение тарифной сметы по водоснабжению за 1 полугодие 2025 года (млн. тенге)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	Утверждено на год	Факт за 5 мес.2025 г.	Откл., %
1	Материальные затраты, в т.ч.:	5 015	1 770	-65%
1.1	материалы на очистку воды	496	189	-62%
1.2	запчасти на автотранспорт и спец.технику	12	8	-34%
1.3	ГСМ	206	85	-59%
1.4	топливо	2,7	1,0	-65%
1.5	электроэнергия покупная	2 232	969	-57%
1.6	покупная вода	2 066	518	-75%
2	Затраты на оплату труда с налогами и отчислениями	3 261	1 952	-40%
3	Амортизация	2 190	376	-83%
4	Ремонт	261	135	-49%
5	Прочие затраты	498	211	-58%
6	Общие и административные расходы	297	123	-59%
7	Расходы на содержание службы сбыта	124	69	-44%
8	Расходы на выплату вознаграждений	0,1	0,3	93%
9	Всего затрат	11 646	4 636	-60%
10	Прибыль	463	453	-2%
11	Всего доходов	12 109	5 089	-58%
12	Объемы оказанных услуг	47,4	20,4	-57%
13	Нормативные потери	13,2%	12,3%	-1%
14	Тариф	255,55	249,21	-2%



Исполнение тарифной сметы по водоотведению за 1 полугодие 2025 года (млн. тенге)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	Утверждено на год	Факт за 5 мес.2025 г.	Откл., %
1.	Материальные затраты, в т.ч.	2 016	530	-74%
1.1.	ГСМ	85	37	-56%
1.2.	топливо	0,7	0,9	29%
1.3.	энергия покупная	960,8	411	-57%
1.4.	запчасти на автотранспорт и спец.технику	6,7	4,9	-27%
1.5.	материалы на очистку сточных вод	962,6	76	-92%
2	Затраты на оплату труда	2 160	1304	-40%
3	Амортизация	667	278	-58%
4	Ремонт	112	101	-9%
5	Прочие затраты	657	201	-69%
6	Общие и административные расходы	368	226	-39%
7	Расходы на содержание службы сбыта	124	69	-44%
8	Расходы на выплату вознаграждений	0,8	0,3	-58%
9	Всего затрат	6 104	2 709	-56%
10	Прибыль	2 736	767	-72%
11	Всего доходов	8 840	3 476	-61%
12	Объемы оказанных услуг	23,2	9,7	-58%
13	Тариф	381,17	357,20	-6%



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2025 года (млн. тенге)

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед.из м.	Утверждено		Факт		Откл	Пояснения
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма		
	ВСЕГО на 2025 год			2 682		215	-2 467	
1	Раздел 1. Служба водоснабжения и очистки. Модернизация водоочистных сооружений	раб.	4	469			-469	Инвестиционная программа утверждена сроком исполнения на 2025 год. Проводятся процедуры государственных закупок на выполнение работ, услуг и закуп материалов, заключены договоры на СМР, авторский и технический надзор. Работы по реконструкции водопроводных сетей выполняются в соответствии с графиком. Проведена реконструкция водопровода Ул.40 лет ВЛКСМ от д 1 до д 43; водопровода внутри м-на 4 Н. Город,Ержанова, вод-д по ул.Интернационалистов,вод-д по ул.Связи (ул.В.Интернационалистов (от ул. Алиханова до ул. Ермакова; водопровода от скв. 115 до н/ст 5 узел (Водопровод по ул. Балхашская 1- 75).
2	Раздел 2. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей	метр	29 691	1 529	8 676	215	-1 314	
3	Раздел 3. ЭМС водоснабжения. Реконструкция н/станции "2 Зона"	раб.	1	555			-555	
4	Раздел 4. СГЭ. Приобретение дизельной электростанции на водопроводные н/станции	шт	3	74			-74	
5	Раздел 5. Погашение основного долга	млн.тг.		55			-55	

Исполнение реконструкции сетей 29,2%



Перечень объектов по замене сетей водоснабжения по программе "Тариф в обмен на инвестиции" на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Диаметр	Утверждено, м	Выполнено, м	Исполнение
1	Водопровод внутри м-на 4 Н. Город, Ержанова, вод-д по ул.Интернационалистов,вод-д по ул.Связи (ул.В.Интернационалистов (от ул. Алиханова до ул. Ермакова)	160; 315	1 373	1 373	100%
2	Водопровод от скв. 115 до н/ст 5 узел (Водопровод по ул. Балхашская 1- 75)	315	1 073	1 073	100%
3	Водопровод по ул. Кривогуза(водопровод по ул. Аманжолова, 29/2-189)	315	1 274	-	Работы запланированы на июль 2025 г.
4	Водопровод по ул. Ишимской (ул. Ишимская, 1-50)	110	633	144	23%
5	Водопровод по ул. Ильича (Ильича 23-147)	110	1 494	1 494	100%
ИТОГО			5 847	4 084	70%



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1-ое полугодие 2025 года



Реконструкция водопровода ул. 40 лет ВЛКСМ




Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1-ое полугодие 2025 года



Реконструкция водопровода от скв. 115 до н/ст 5 узел
(Водопровод по ул. Балхашская)



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1-ое полугодие 2025 года

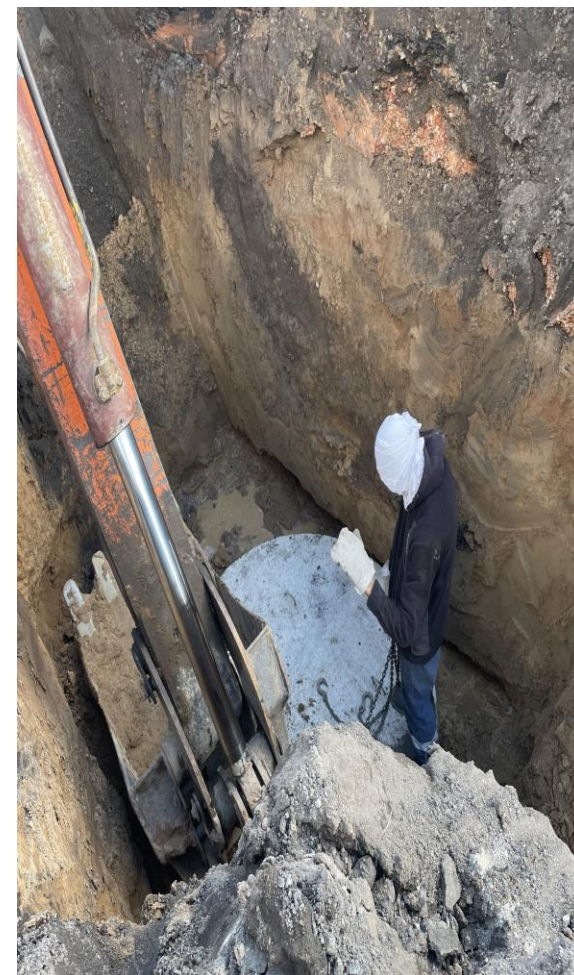

Реконструкция водопровода внутри м-на 4 Н. Город, Ержанова,
по ул. В.Интернационалистов, по ул. Связи
(ул. В.Интернационалистов от ул. Алиханова до ул. Ермакова)



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1-ое полугодие 2025 года



Капитальный ремонт водопровода по ул. Ильича



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1 полугодие 2025 года (млн. тенге)

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед. изм.	Утверждено		Факт		Откл	ПОЯСНЕНИЯ
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма		
	ВСЕГО на 2025 год			3 577		244	-3 333	
1	Раздел 1 . Реконструкция канализационных сетей			2 802		244	-2 558	Инвестиционная программа утверждена на 2025 год. Проводятся процедуры гос. закупок, заключения договоров на выполнение работ, закуп материалов.
1.1	Капитальный ремонт канализационных сетей	метр	19 897	2 802	4 087	244	-2 558	Работы по реконструкции канализационных сетей выполняются в соответствии с графиком. Проведена реконструкция кан. сетей от д.1-1а, 3-3а, 2-2а ул.Сталелитейная; по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (мкр.23 д.16-19); по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул. Металлистов д.26/4); кан. линия к дому 48-49 пр.Н.Абдирова 25; канализации от дом 4-5 ул. Гапеева (ул.Гапеева 14); кан. к д.20-21, 21а, 24, 25, 46, 29,мкр.23 Пришахт-к (23 мкр. д.27-46); реконструкция коллектора от 50 кв Н.Города до гл. коллектора (пр.Б.Жырау 33, 35, ул.В.Интернационалистов 22а).
2	Раздел 2. Энерго-механическая служба	раб	1	454			-454	Замена насосных агрегатов на КНС. Заключен договор №04-10/39 с ТОО "Digital Trend"
3	Раздел 3. Погашение основного долга	млн.тг		321			-321	Срок выплаты: декабрь 2025 года

Исполнение реконструкции сетей 20,5%



Перечень объектов по замене сетей водоотведения по программе "Тариф в обмен на инвестиции" на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Диаметр, мм	Утверждено, м	Выполнено, м	Исполнение
1	Реконструкция Коллектора М-на 28, Канализации мкр. 1-2 Юго-Востока (коллектор по пр.Шахтеров)	600	1 028		Работы запланированы на август 2025 г.
2	Реконструкция Канализации к д. 28-29 М-27 (коллектор по ул.Университетская от д.19/2 до пр.Шахтеров)	300-400	627		Планируется исключить. Заявка на корр-ку ИП на рассмотрении в ДКРЕМ
3	Реконструкция Канализационных сетей от домов по ул.Штурманская	400	880	309	35%
4	Реконструкция Канализация к дому 33, 30 мкр. "Орбита"	150	200		Работы запланированы на июль 2025 г.
5	Реконструкция Коллектора м-на 28, Канализационного коллектора по ул. Сатыбалдина	200-400	833		Работы запланированы на июль 2025 г.
6	Реконструкция Канализационного коллектора М-29 (по ул.Университетская от д.17 до ул.Муканова)	300	360		Планируется исключить. Заявка на корр-ку ИП на рассмотрении в ДКРЕМ
7	Реконструкция Канализационного коллектора М-29 (по ул.Муканова от д.18 до ул.Университетская)	300	678		Работы запланированы на август 2025 г.
8	Реконструкция Канализации от д/у 5 Н.Майкудук; Коллектора 2 очереди в М-не 1 (ул.Кузембаева 40-46, 56, 58, 72, 84)	150-250	935		Работы запланированы на август 2025 г.
9	Реконструкция Канализационных сетей по Октябрьскому району от Карагандинского УЖКХ (ул.Архитектурная 3, 5, 7, 9, 11, 16 ул.Гвардейская 3)	150	374		Работы запланированы на август 2025 г.
10	Реконструкция канализации от дома 12 М-18; Канализация к дому 11 в М-не 18; Канализация от дома 30, 31 по ул.Бабушкина; Канализация к д.14, 17, 18 Майкудук 18 м-он (мкр.18 д.11, 12, 13, 14)	150	402	174	43%
11	Реконструкция Канализационных сетей по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул.Сводная 1, 3, 7, 17, 19; ул.Зелинского 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20)	150	720		Работы начаты с 01.07.2025 г.
12	Реконструкция Канализационных сетей по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул.Восточная 4, 6, 8, 12, 14, 18, 22, 24; ул.Зелинского 1, 3, 5, 7, 7а, 9а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)	150	1 031		Работы запланированы на июль 2025 г.




Перечень объектов по замене сетей водоотведения по программе "Тариф в обмен на инвестиции" на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Диаметр, мм	Утверждено, м	Выполнено, м	Исполнение
13	Реконструкция Кан. сетей по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул.Мирная 4, 6, 8, 14а, 16а, 18; ул.Библиотечная 2, 4, 6, 7, 26а, 31а, 30, 32; ул.Аптечная 1)	150	1 184	505	43%
14	Реконструкция Кан. сетей по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул.Стахановская 17, 24, 22)	150	474		Работы запланированы на август 2025 г.
15	Реконструкция Канализационных сетей по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (мкр. 23 д.30-34, 37-39)	150	894	335	38%
16	Реконструкция Канализации д/управления 3 Пришахтинск (ул.Зелинского 24/4, 24/5, 26/2, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 32)	150	972		Работы запланированы на июль 2025 г.
17	Реконструкция Кан. линии по ул.Медицинская (ул.Медицинская 32, 34, 36, 38, 40)	150	224		Работы запланированы на август 2025 г.
18	Реконструкция Канализационных сетей ст.Караганда-Сортировочная от ВОДЧ-7 (Коллектор по ул.Локомотивная от д.2/2 до д.104)	300	1 120	82	7%
19	Реконструкция Канализации к домам 42, 46 М-на 5 (пр.Н.Абдирова 19 до Ермекова 5/1)	150; 200	375		Работы запланированы на июль 2025 г.
20	Реконструкция Коллектора от 50 кв Н.Города до гл. коллектора (пр.Б.Жырау 33, 35, ул.В.Интернационалистов 22а)	300	245	246	100%
21	Реконструкция Канализации в кв. 26, 39, 41-56 Ленина, Б-Мира, Гоголя (ул. Гоголя 56/3, Н.Абдирова 46/3, 46/2, 44/2, 44/1 до врезки в ул.Гоголя 68)	150; 200	530		Работы запланированы на август 2025 г.
22	Реконструкция Канализации пр. Н.Абдирова 36, ул.Гоголя 58, ул.Ерубаева 54, ул.Алиханова, пр.Н.Абдирова 26, к дому 1 кв. 57-58 Н.Город (от пр.Н.Абдирова 38, ул.Гоголя 55,57 до коллектора, от пр.Н.Абдирова 26/1 до коллектора)	150; 250	720		Работы запланированы на август 2025 г.
23	Реконструкция кан. сетей по ул.Гражданская п.Актас; от контрольных колодцев кв.18,17,15 п.Актас; коллектор Актаса и очистных сооружений по ул.Городской (ул.Гражданская 10-мкр.1д.2)	200	690		Работы запланированы на июль 2025 г.
24	Реконструкция Канализационных сетей по Октябрьскому р-ну от Карагандинского УЖКХ (перенос 2024 года на 2025 год)	160; 200	1 407	639	45%
ИТОГО			16 903	2 290	14%



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1-ое полугодие 2025 года

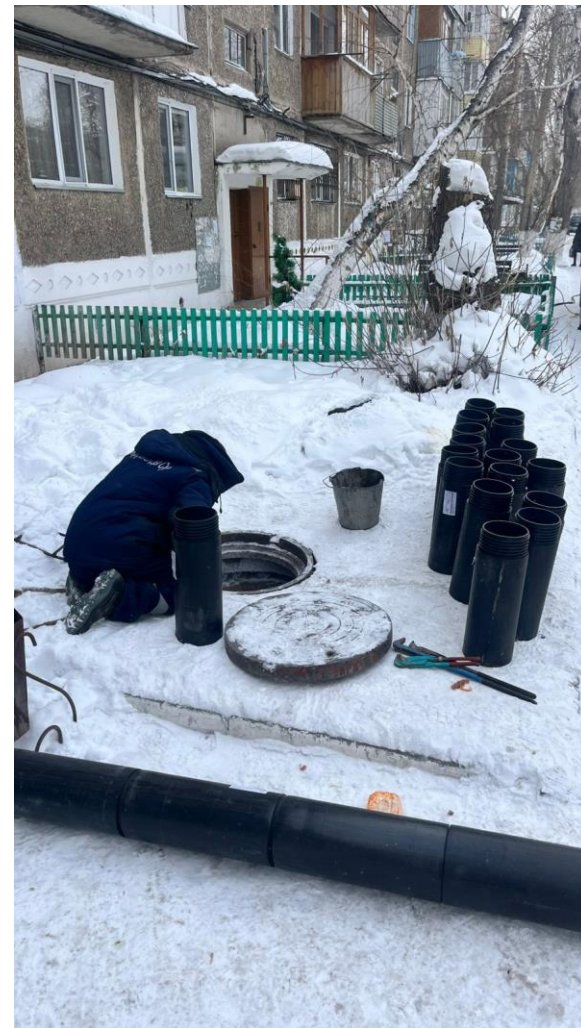

Капитальный ремонт канализационных сетей мкр. 23 д. 16-19




Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1-ое полугодие 2025 года



Капитальный ремонт канализационных сетей мкр.23 Пришахтинск д.27-46




Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1-ое полугодие 2025 года

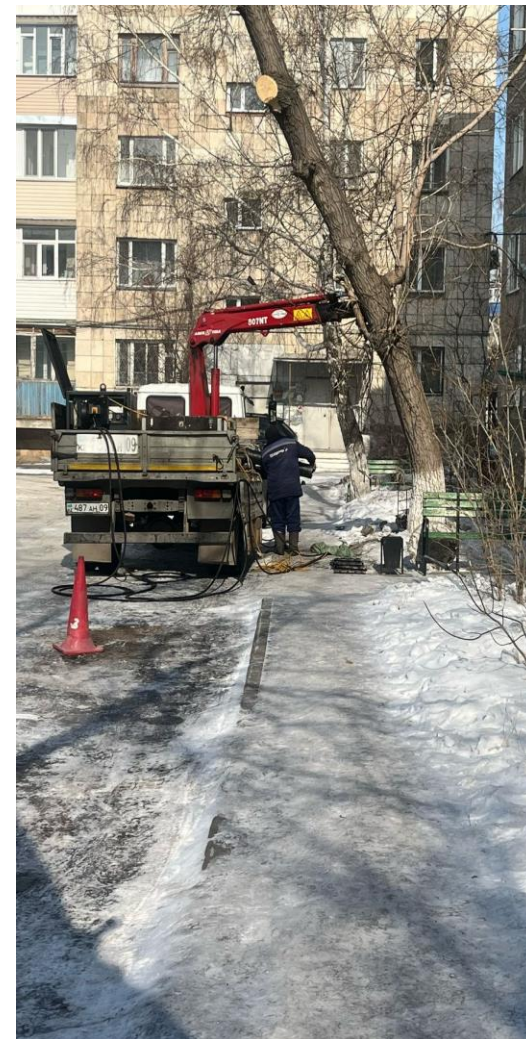

Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Металлистов д.26/4



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1-ое полугодие 2025 года

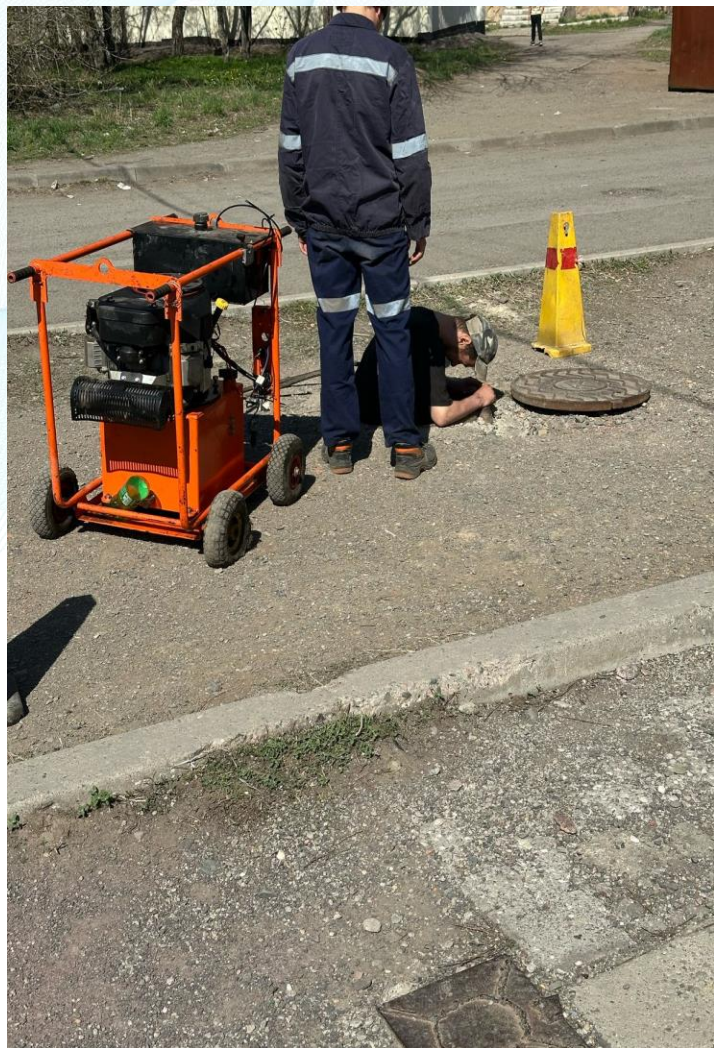

Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Сталелитейная



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1-ое полугодие 2025 года



Капитальный ремонт канализационной линии по пр. Н.Абдирова 25



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1-ое полугодие 2025 года



Реконструкция Коллектора от 50 кв. Н.Города до главного коллектора
(пр. Б. Жырау 33, 35, ул. В. Интернационалистов 22а)




Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1-ое полугодие 2025 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Гапеева



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1-ое полугодие 2025 года

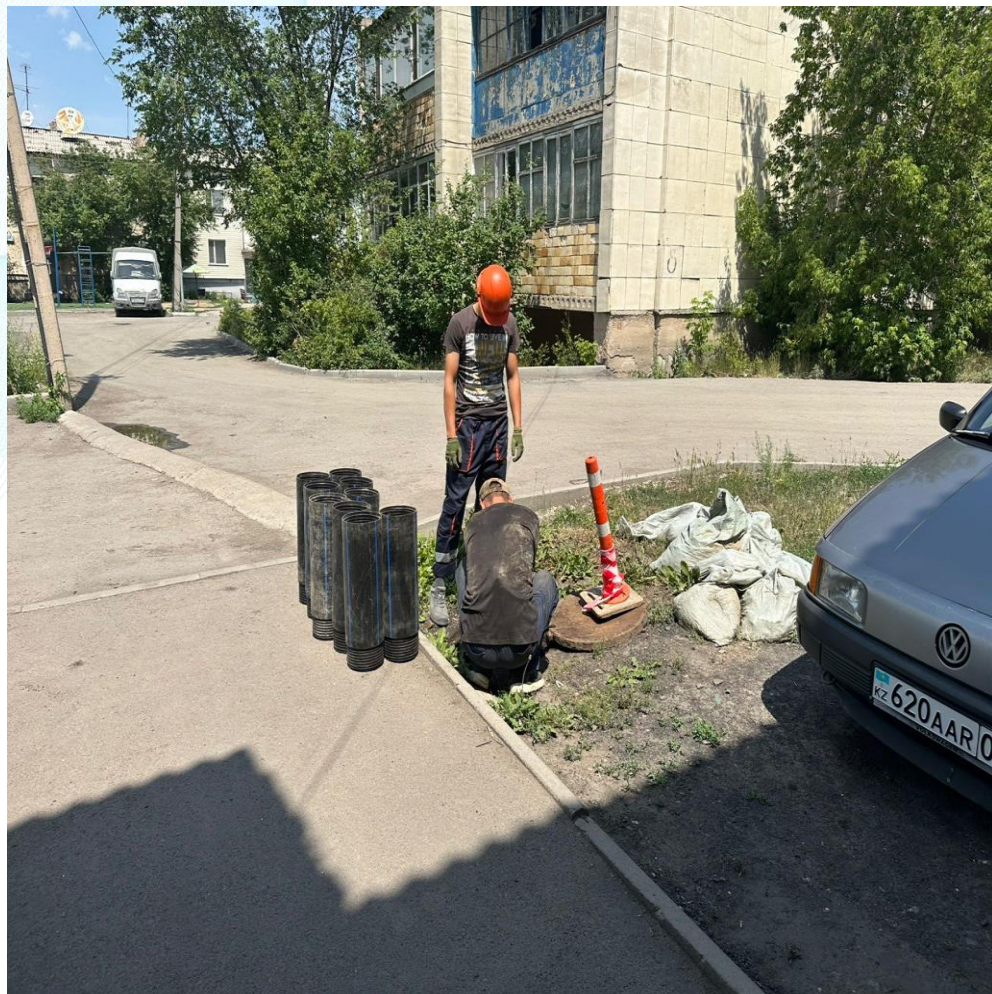

Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Мирная




Ожидаемые эффекты от реализации инвестиционной программы:

- снизить уровень физического износа сетей водоснабжения - **на 1,5%**
водоотведения - **на 2%**
- повышение качества оказания услуг потребителям;
- сокращение количества аварий и засоров на сетях **на 5%**
- повышение энергоэффективности за счет экономии электрической энергии на 5-7%
- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения за счет проводимой реконструкции сетей и модернизации оборудования




Ликвидация аварий на сетях водоснабжения, шт.

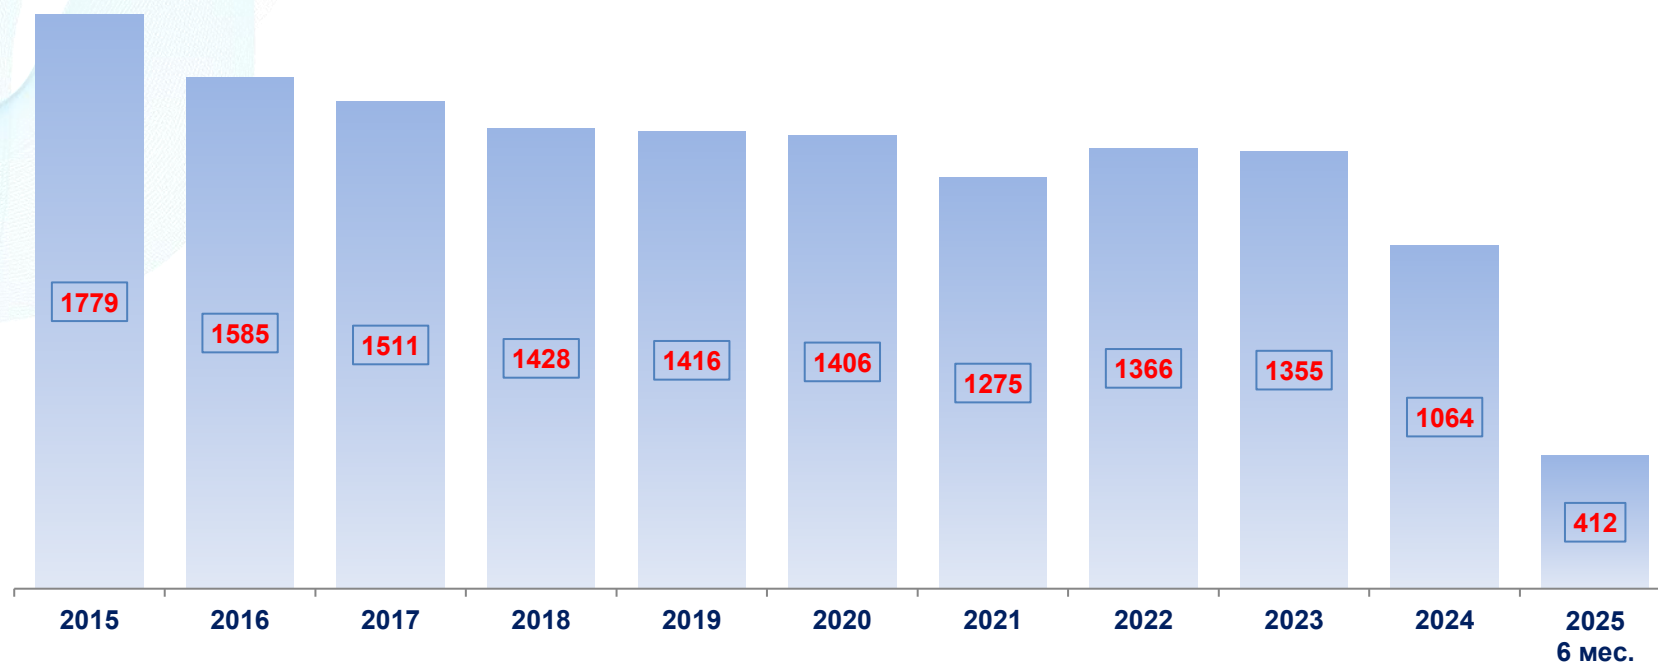



Динамика очистки засоров на сетях водоотведения, шт.

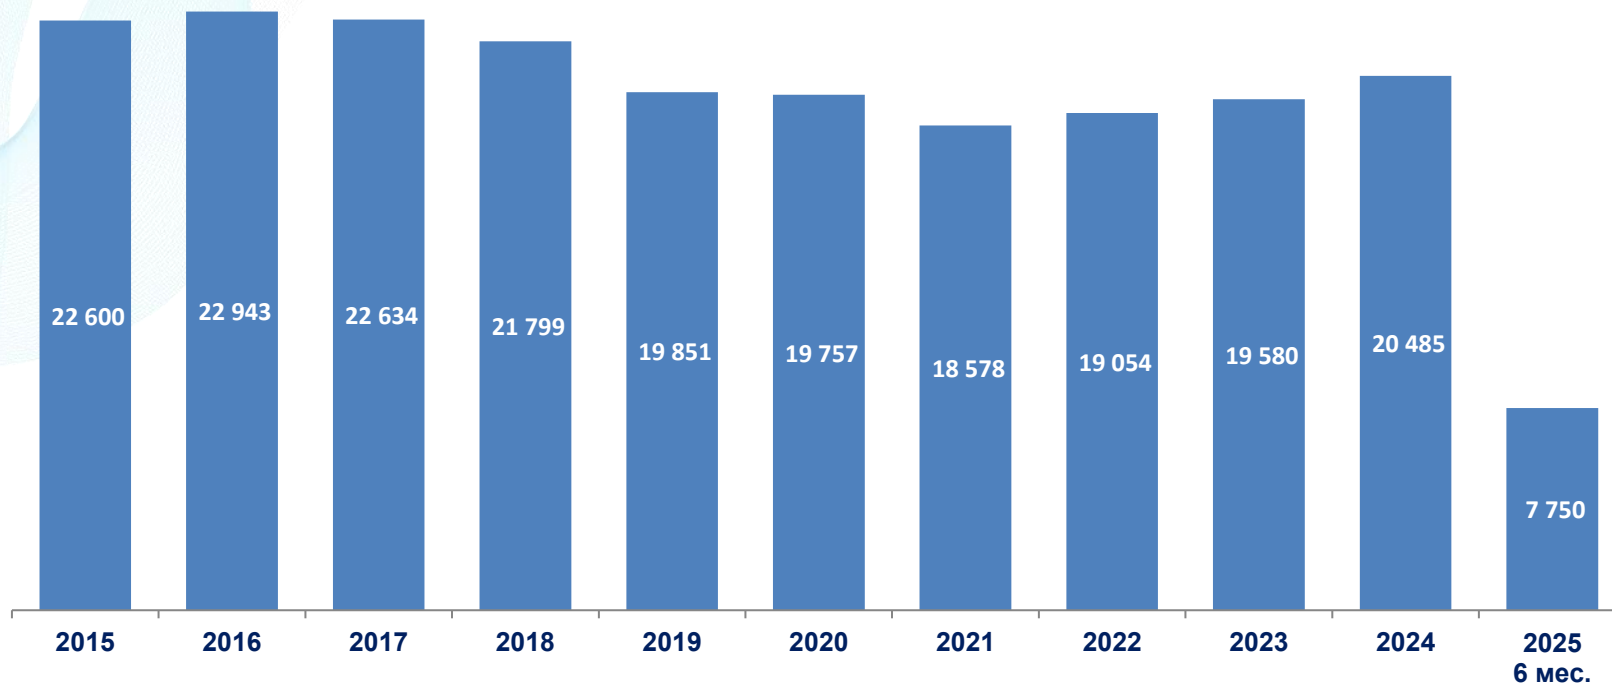



Кадровая ситуация

Численность персонала предприятия составляет

1 620 человека, в том числе:


- в водоснабжении 946 человека
- в водоотведении 674 человек

Средний возраст работников **46** лет


Сотрудники с высшим образованием по специальности «Водопровод и канализация» – **15** человек

Структура персонала предприятия


- высшее образование
- среднетехническое образование
- среднеспециальное образование
- среднее образование



Динамика оплаты труда, тыс. тенге

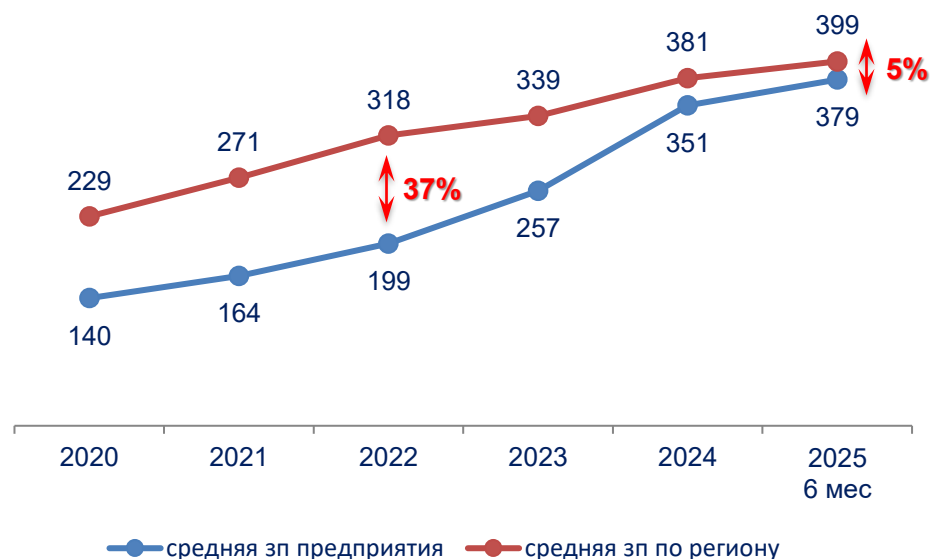

Текучесть кадров, %





Заработная плата сотрудников

Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2025 г.)

Статья 22.

1. Основаниями изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия являются:

2. ...

9-3) изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника субъекта естественной монополии, предоставляющего регулируемые услуги, предусмотренные подпунктом 14) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона *(водоснабжения и (или) водоотведения)*.

При этом основанием для изменения является изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год, предусмотренной для субъектов естественных монополий, оказывающих регулируемые услуги, указанные в подпунктах 3) и 4) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона *(по передаче электрической энергии, по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии)*;

	В утвержденных тарифах на 2025 год	Факт за 6 мес. 2025 года	Отклонение		По данным статистики по Кар. области по деятельности «Электро- и теплоэнергетика» за 2024 год	Отклонение	
	тенге в мес.	тенге в мес.	тенге в мес.	%	тенге в мес.	тенге в мес.	%
Средняя заработная плата персонала	238 403	378 633	140 230	+59%	428 276	от факта 49 643	+13%
						от утвержденного 189 873	+80%



Проводимая работа с потребителями

Мероприятия	Физические лица			Юридические лица		
	6 мес. 2024 г.	6 мес. 2025 г.	Откл.	6 мес. 2024 г.	6 мес. 2025 г.	Откл.
Отключение от водоснабжения потребителей за задолженность, шт.	353	226	-127	27	23	-4
Вручено абонентам предупреждений о погашении задолженности, шт.	125 235	114 837	-10 398	141	78	-63
Выявление фактов нарушений правил пользования услугами водоснабжения и водоотведения, шт.	962	645	-317	108	148	40
Выдано предписаний и повторных уведомлений на установку ИПУ, шт.	65 358	73 740	8 382	176	66	-110
Инвентаризация объектов юридических лиц, шт.				737	1 492	755
Инвентаризация частного сектора физических лиц, шт.	2 575	3 080	505			
Контроль по соблюдению межповерочных интервалов ИПУ, выписываются предписания о проведении поверки	32 228	35 547	3 319	307	94	-213
Рассмотрены и даны ответы на письменные заявления потребителей	2 760	3 385	625	347	586	239
Оплачена сумма за подключение потребителей к системе водоснабжения после погашения задолженности, тенге	139 613	59 130	-80 483			



Динамика дебиторской задолженности млн. тенге



- Дебиторская задолженность населения на 01.07.2025 г. – 157 млн. тенге.
- В целях возврата проводится работа по отключению услуг водоснабжения и водоотведения у должников, по подаче исковых заявлений в судебные органы и оформлению исполнительных надписей



Благодарим за внимание!

kar-su.kz
